

ගම සමඟ පිළිසඳර 2022
ග්‍රාමීය සංවර්ධන යෝජනා
වැය ශීර්ෂය 255-1-01-008-2509-068
2022.08.31 දිනට ප්‍රගතිය

ලබා දුන් ප්‍රතිපාදනය (ප්‍රා.ලේ.ප. වී. සමඟ) (1)

දි.ලේ.ප.වියදම (2)

කාර්තුවට වෙන් කළ මුළු ප්‍රතිපාදනය (3)=(1)+(2)

=

11,418,682.00

=

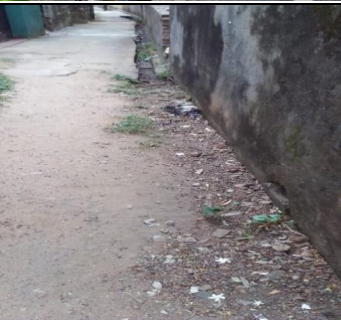
109,267.75

=

11,527,949.75

* ලබා දුන් ඉලක්කය රු මි 9 වුවත් දි.ලේ වීසින් නිදහස් කර ඇති ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු 8,999,985.27 කි.ඒ අනුව රු 14.73 ක වෙනසක් දැක් වේ.

අනු අංකය	ග්‍රා.නි.වසම	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	අවසාන බිල්පත අනුව				ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ් කළ)	ප්‍රා.ලේ. ඇතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
							වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)=(1)*2%	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%				
1	උද්‍යාන	2022/Q1/GND/D EH/488/CD/ 01	උද්‍යාන වසමේ වනරතන පාරේ වරිපනම් අංක 89 එල් සිට ඉදිරියට කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CD	907,866.47	950,000.00	881,423.76		17,628.48	8,814.24	881,423.76	17,628.48		
2	කරගම්පිටිය	2022/Q1/GND/D EH/489/CD/02	කරගම්පිටිය වසමේ කව්ඩාන පාරේ අංක 119 නිවෙස අසලින් ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගය,ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කැට ගල් ඇල්ලීම.	CD	388,909.05	400,000.00	377,581.60		7,551.63	3,775.82	377,581.60	7,551.63		
3	කළුබෝවිල	2022/Q1/GND/D EH/490/CD/02	කළුබෝවිල වසමේ පීරිස් පාරේ පොදු නාන ලීඳ සංවර්ධනය කිරීම.	CD	209,448.06	300,000.00	203,347.63		4,066.95	2,033.48	203,347.63	4,066.95		

අනු අංකය	ග්‍රා.නි.වසම	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	අවසාන බිල්පත අනුව				ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අකැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
							වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)=(1)*2%	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%				
4	කොහුවල	2022/Q1/GND/D EH/491/CD/01	කොහුවල වසමේ ඕල්ඩ් මාවත අංක 3/3 නිවාස පිහිටි වත්ත තුල වැසි ජලය බැස යාම සඳහා වන කාණු පද්ධතිය U හැඩයට කොන්ක්‍රීට් කර ආවරණ ස්ලැබ් පියන් දමා සංවර්ධනය කිරීම.	CD	481,529.69	500,000.00	467,504.55		9,350.09	4,675.05	467,504.55	9,350.09		
5	ජයතිලක	2022/Q1/GND/D EH/492/CD/01	ජයතිලක වසමේ දෙහිවල දෙමළ මහා විදුහලේ නව ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CD	300,000.00	300,000.00	291,262.14		5,825.24	2,912.62	291,262.14	5,825.24		
6	මල්වත්ත	2022/Q1/GND/D EH/494/CD/03	මල්වත්ත වසමේ ධර්මරාජ මාවත අංක 180 /1ඒ (ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය පිටුපස) සිට ඉදිරියට කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් ආවරණ යොදා සංවර්ධනය කිරීම.	CD	1,089,791.00	1,200,000.00	1,058,049.51		21,160.99	10,580.50	-	1,079,210.50		
7	හත්බෝධිය	2022/Q1/GND/D EH/496/CD/02	හත්බෝධිය වසමේ හත්බෝධිය පාර නිවාස අංක 46/15 සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය පුළුල් කොට, ස්ලැබ් කවර දමා සංවර්ධනය කිරීම.	CD	199,167.72	500,000.00	193,366.72		3,867.33	1,933.67	-	197,234.05		

							අවසාන බිල්පත අනුව				ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) =(1)+(2)+(3) (රෙඩ් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අකැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) = (1)+(2)+(3)(රෙඩ් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
අනු අංකය	ග්‍රා.නි.වසම	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)=(1)*2%	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%				
8	දෙහි/බටහිර	2022/Q1/GND/D EH/499/CD/03	දෙහි/බටහිර වසමේ රාමනාදන් පාර අංක 28 සිට ඉදිරියට ඇති කාණුව U හැඩයට සංවර්ධනය කිරීම	CD	345,174.12	400,000.00	335,120.50		6,702.41	3,351.21	335,120.50	6,702.41		
9	දුටුගැමුණු	2022/Q1/GND/D EH/502/CD/02	දුටුගැමුණු වසමේ විත්තාරාම පාරේ අංක 143/2 නිවස අවසානයෙන් පටන් ගන්නා ඇළෙහි පැති බැම්ම විත්තාරාමය දෙසට සංවර්ධනය කිරීම	CD	1,014,663.88	1,200,000.00	985,110.56		19,702.21	9,851.11	985,110.56	19,702.21		
10	කරගම්පිටිය	2022/Q1/GND/D EH/489/CD/03	කරගම්පිටිය වසමේ ධම්මාලංකාර මාවතේ අංක 39/5 නිවස අසලින් ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම	CD	199,818.77	200,000.00	193,998.81		3,879.98	1,939.99	193,998.81	3,879.98		
11	කරගම්පිටිය	2022/Q1/GND/D EH/489/CD/04	කරගම්පිටිය වසමේ සුබෝධාරාම පාරේ අංක 20/1 නිවෙස අසලින් ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගයේ ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම.	CD	599,609.69	600,000.00	582,145.33		11,642.91	5,821.45	582,145.33	11,642.91		

අනු අංකය	ග්‍රා.නි.වසම	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	අවසාන බිල්පත අනුව					ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අකැපී බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
							වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)=(1)*2%	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%					
12	ගල්වල	2022/Q1/GND/D EH/497/SD/05	ගල්වල වසමේ ප්‍රතිබිම්බාරාම විහාරස්ථානයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.	SD	299,999.08	300,000.00	291,261.24		5,825.22	2,912.61	291,261.24	5,825.22			
13	දෙහි/බටහිර	2022/Q1/GND/D EH/499/SD/05	දෙහි/බටහිර වසමේ ආනන්ද ධර්මරාජ විහාරස්ථානයේ පුස්තකාලයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම.	SD	299,966.90	300,000.00	291,230.00		5,824.60	2,912.30	291,230.00	5,824.60			
14	දෙහිවල නැගෙනහිර	2022/Q1/GND/D EH/500/SD/03	දෙහිවල නැගෙනහිර වසමේ ශ්‍රී මහා බෝධි විහාරස්ථානයේ දහම් සාසල සඳහා භාවිතාකරන ගොඩනැගිල්ලේ උඩු මහලේ කොටසක් සංවර්ධනය කිරීම.	SD	299,581.44	300,000.00	290,855.77		5,817.12	2,908.56	290,855.77	5,817.12			
15	නැගෙනහිර කව්ඛාන	2022/Q1/GND/D EH/501/SD/04	නැගෙනහිර කව්ඛාන වසමේ නැදිමාල ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාර භූමියේ කුට්ටිගල් ඇල්ලීම -(1 වන අදියර).	SD	299,925.67	300,000.00	291,189.97		5,823.80	2,911.90	291,189.97	5,823.80			

අනු අංකය	ග්‍රා.නි.වසම	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	අවසාන බිල්පත අනුව				ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අකැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ් කළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
							වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)=(1)*2%	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%				
16	සරණංකර	2022/Q1/GND/D EH/495/SD/02	සරණංකර වසමේ සංඝරාජ විහාරස්ථානයේ හික්ෂු තෝවාසිකාගාරයේ අඩක් නිමවූ වැසිකිළි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් පිළිසකර කිරීම	SD	196,702.34	200,000.00	190,973.15		3,819.46	1,909.73	-	194,792.61		
17	සරණංකර	2022/Q1/GND/D EH/495/SD/03	සරණංකර වසමේ ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ සංඝාවාසයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරනය කිරීම	SD	99,997.65	100,000.00	97,085.10		1,941.70	970.85	-	99,026.80		
18	මල්වත්ත	2022/Q1/GND/D EH/494/LH/01	මල්වත්ත වසමේ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ නිරත තෝරා ගත් ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා උපකරණ ලබා දීම.	LH	360,000.00	392,485.44	349,514.56		6,990.29	3,495.15	349,514.56	6,990.29		
19	නැගෙනහිර කව්ඩාන	2022/Q1/GND/D EH/501/LH/03	නැගෙනහිර කව්ඩාන වසමේ ඇගළුම් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා තෝරා ගත් ප්‍රතිලාභීන් සඳහා උපකරණ ලබා දීම	LH	450,000.00	615,906.80	436,893.20		8,737.86	4,368.93	436,893.20	8,737.86		

අනු අංකය	ග්‍රා.නි.වසම	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	අවසාන බිල්පත අනුව				ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ්මි කළ)	ප්‍රා.ලේ. අකැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ්මි නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
							වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)=(1)*2%	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%				
20	ජයතිලක	2022/Q1/GND/D EH/492/CD/02	ජයතිලක වසමේ දෙහිවල දෙමළ මහා විදුහල සඳහා සුහුරු පංති කාමර සඳහා අවශ්‍ය උපකරන ලබා දීම	CD	854,900.00	854,900.00	830,000.00		16,600.00	8,300.00	330,000.00	516,600.00		
21	දෙහිවල නැගෙනහිර	2022/Q1/GND/D EH/500/CD/02	දෙහිවල නැගෙනහිර වසමේ විද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන අසල බෝක්කුව පිහිටි ස්ථානයෙන් ආරම්භ කර, දිපානන්ද මාවතේ ඇල මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදි කිරීම.	CD	1,197,612.36	1,200,000.00	1,162,730.45		23,254.61	11,627.30		1,185,985.06	 	
22	හත්බෝධිය	2022/Q1/GND/D EH/496/CD/02	හත්බෝධිය වසමේ හත්බෝධිය පාර නිවාස අංක 46/15 හිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය පුළුල් කොට, ස්ලැබ් කවර දමා සංවර්ධනය කිරීම	CD	300,832.28	500,000.00	292,070.17		5,841.40	2,920.70		297,911.57		
23	ගල්වල	2022/Q1/GND/D EH/497/CD/02	ගල්වල වසමේ රොබට් පාරේ අඩක් නිමකල, අංක 27/1 දරණ නිවසේ ඉතිරි වැඩ සම්පූර්ණ කිරීම.	CD	199,785.99	200,000.00	193,966.98		3,879.34	1,939.67		197,846.32	 	

							අවසාන බිල්පත අනුව				ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) =(1)+(2)+(3) (ලෙඩ් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අකැපී බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) = (1)+(2)+(3)(ලෙඩ් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
අනු අංකය	ග්‍රා.නි.වසම	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)=(1)*2%	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%				
24	ලේවල	2022/Q1/GND/D EH/497/CD/04	ගල්වල වසමේ මෙතෝදිස්ත විදුහලට තව පිවිසුම් ගේට්ටුවක් සවිකිරීම.	CD	99,921.54	100,000.00	97,011.20		1,940.22	970.11		98,951.42		
25	හත්බෝධිය	2022/Q1/GND/D EH/496/LH/01	හත්බෝධිය වසමේ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ නිරත තෝරා ගත් ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා උපකරණ ලබා දීම.	LH	211,193.31	211,193.31	205,042.05		4,100.84	2,050.42		209,142.89		
26	දෙහිවල නැගෙනහිර	2022/Q1/GND/D EH/500/LH/01	දෙහිවල නැගෙනහිර වසමේ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ නිරත තෝරා ගත් ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා උපකරණ ලබා දීම.	LH	66,958.81	66,958.81	65,008.55		1,300.17	650.09		66,308.72		
27	කරගම්පිටිය	2022/Q1/GND/D EH/489/LH/05	කරගම්පිටිය වසමේ ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා උපකරණ ලබා දීම.	LH	451,660.20	451,660.20	438,505.05		8,770.10	4,385.05		447,275.15		
එකතුව					11,425,016.01	9,913,292.24	11,092,248.55	-	221,844.97	110,922.49	6,598,439.62	4,715,653.90		

අනු අංකය	ග්‍රා.නි.වසම	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	අවසාන බිල්පත අනුව				ප්‍රා.ලේ.මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ්මි කළ)	ප්‍රා.ලේ. අකැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) = (1)+(2)+(3) (රෙඩ්මි නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
							වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)=(1)*2%	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%				
වියදම් කළ පරිපාලන මුදල											11,780.00	(11,780.00)		
											6,610,219.62	4,703,873.90		
පවරන පරිපාලන වියදම												-13904.18		
සත්‍ය අකැති බිල්පත් වටිනාකම												4,689,969.72		
