

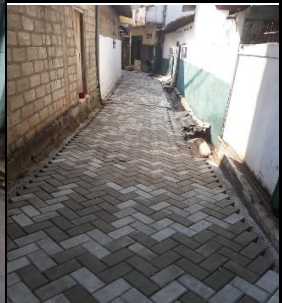
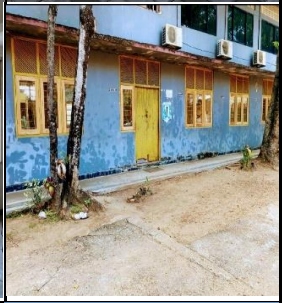
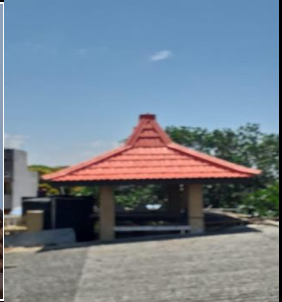
ගම සමඟ පිළිසඳර 2022
පළාත් පාලන කොට්ඨාස සංවර්ධන යෝජනා
වැය ශීර්ෂය 255-1-01-008-2509-069
2022.09.15 දිනට ප්‍රගතිය

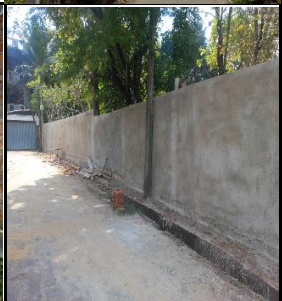
ලබා දුන් ප්‍රතිපාදනය (ප්‍රා.ලේ.ප. වී. සමඟ) (1) = රු.12,611,345.55
දි.ලේ.ප.වියදම (2) = රු.123,640.64
කාර්තු වට වෙන් කළ මුළු ප්‍රතිපාදනය (3)=(1)+(2) = රු.12,734,986.19 =(12,733,303.45+1682.74)

දෙතිවල							අවසාන බිල්පත අනුව							
අනු අංක ය	පළාත් පාලන කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%	ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) (ගෙවීම් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) (ගෙවීම් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
1	නැගෙනහිර කඩ්ඩාන	2022/Q1/LGS/DEH/258/LH/01	නැගෙනහිර කඩ්ඩාන වසමේ ඇඟළුම් කර්මාන්තයේ නියුතු තෝරා ගත් ප්‍රතිලාභීන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම.	LH	157,384.00	366,416.32	152,800.00	-	3,056.00	1,528.00	-	155,856.00		
2	නැගෙනහිර කඩ්ඩාන	2022/Q1/LGS/DEH/258/CD/03	නැගෙනහිර කඩ්ඩාන වසමේ තෝරා ගත් මාර්ගයන්හි LED ලාම්පු සවි කිරීම -(2 වන අදියර).	CD	1,513,465.52	1,589,138.80	1,469,384.00	-	29,387.68	14,693.84	-	1,498,771.68		
3	නැගෙනහිර කඩ්ඩාන	2022/Q1/LGS/DEH/258/SD/04	නැගෙනහිර කඩ්ඩාන වසමේ නැදිමාල ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාර භූමියේ කුට්ටිගල් ඇල්ලීම -(2 වන අදියර).	SD	199,983.21	200,000.00	194,158.47	-	3,883.16	1,941.58	-	198,041.63	 	

අනු අංක ය	පළාත් පාලන කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%	ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) (ගෙවීම් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) (ගෙවීම් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
4	නැගෙනහිර කඩ්ඩාන	2022/Q1/LGS /DEH/258/SD /05	නැගෙනහිර කඩ්ඩාන වසමේ ශ්‍රී මංගලාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.	SD	199,614.00	200,000.00	193,800.00	-	3,876.00	1,938.00	193,800.00	3,876.00		
5	දුටුගැමුණු	2022/Q1/LGS /DEH/249/CD /02	දුටුගැමුණු වසමේ කොහුවල ජයසිංහ මාවතෙහි අංක 45 න් පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය ඉදිරියට කැට ගල් අල්ලා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	CD	1,286,594.49	1,300,000.00	1,249,120.86	-	24,982.42	12,491.21	1,249,120.86	24,982.42		
6	දුටුගැමුණු	2022/Q1/LGS /DEH/249/CD /03	දුටුගැමුණු වසමේ සිරිගල් මාවතේ අංක 19/5 නිවස අසලින් පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කැට ගල් අල්ලා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	CD	281,491.19	300,000.00	273,292.43	-	5,465.84	2,732.92	273,292.43	5,465.84		
7	කොහුවල	2022/Q1/LGS /DEH/250/CD /02	කොහුවල වසමේ නුගේගොඩ ශාන්ත ජෝන් විදුහලේ නව බාලදක්ෂ ගොඩනැගිල්ලේ කොටසක් ඉදිකිරීම.-(1 වන අදියර)	CD	397,178.77	400,000.00	385,610.47	-	7,712.20	3,856.10	385,610.47	7,712.20		

අනු අංක ය	පළාත් පාලන කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%	ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) (ගෙවීම් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) (ගෙවීම් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
8	කළුබෝවිල	2022/Q1/LGS /DEH/251/CD /02	කළුබෝවිල වසමේ පිරිස් පාරේ අංක 57 න් පටන් ගන්නා කුඩා ඇළ මාර්ගයේ ඉතිරි වී ඇති කොටසේ ස්ලැබ් කවර දැමීම.	CD	99,810.30	100,000.00	96,903.21	-	1,938.06	969.03	96,903.21	1,938.06		
9	කළුබෝවිල	2022/Q1/LGS /DEH/251/SD /03	කළුබෝවිල වසමේ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති දහම්පාසලේ දහම්පාසල ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම.	SD	400,000.00	400,000.00	388,349.51	-	7,767.00	3,883.50	-	396,116.51		
10	විලවල	2022/Q1/LGS /DEH/248/SD /02	විලවල වසමේ පාමංකඩ සංඝමිත්තා දහම් පාසල සඳහා නව වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.	SD	399,965.21	400,000.00	388,315.73	-	7,766.31	3,883.16	388,315.73	7,766.31		
11	විලවල	2022/Q1/LGS /DEH/248/CD /03	විලවල වසමේ ද සිල්වා හරස් පාරෙන් ආරම්භ වී සුජාතා මාවතට සම්බන්ධ වන කාපටි අතුරු ලද අතුරු මාර්ගයේ, ද සිල්වා හරස් පාරේ සිට ආරම්භ වන පටු මාර්ග කොටසේ එක් පසක ඇති වැසි ජල කාණුව සුදුසු පරිදි සකසා ස්ලැබ් ආවරණ යෙදීම.	CD	97,100.19	100,000.00	94,272.03	-	1,885.44	942.72	-	96,157.47		

අනු අංක ය	පළාත් පාලන කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%	ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) (ගෙවීම් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) (ගෙවීම් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
12	විලවල	2022/Q1/LGS /DEH/248/CD /04	විලවල වසමේ බෝධියවත්ත අංක 29 /130/33න් ආරම්භ වන මාර්ගයේ පැති කාණුව සකසා මාර්ගයේ කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම.	CD	499,968.23	500,000.00	485,406.05	-	9,708.12	4,854.06	-	495,114.17		
13	හත්බෝධිය	2022/Q1/LGS /DEH/252/CD /01	හත්බෝධිය වසමේ බුද්ධසෝම විදුහලේ දැරණියගල ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම.	CD	599,999.99	600,000.00	582,524.27	-	11,650.48	5,825.24	-	594,174.75		
14	හත්බෝධිය	2022/Q1/LGS /DEH/252/SD /02	හත්බෝධිය වසමේ හත්බෝධිය රජමහා විහාරයේ ශ්‍රී බෝධි රාජ දහම් පාසලේ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ සංවර්ධන කටයුතු කිරීම.	SD	399,981.60	400,000.00	388,331.64	-	7,766.63	3,883.32	-	396,098.27		
15	මල්වත්ත	2022/Q1/LGS /DEH/260/CD /03	මල්වත්ත වසමේ දෙහිවල වෛද්‍ය පාරේ අංක 150 නිවස අසලින් පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය(බොරළු පාර) සංවර්ධනය කිරීම.	CD	799,951.38	800,000.00	776,651.83	-	15,533.04	7,766.52	776,651.83	15,533.04		

අනු අංක ය	පළාත් පාලන කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%	ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) (ගෙවීම් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) (ගෙවීම් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
16	උද්‍යාන	2022/Q1/LGS /DEH/256/CD /02	උද්‍යාන වසමේ වනරක්‍ෂණාරාම පාර අංක 29/ A සිට 15/A දෙසට පැති කාණුව සංවර්ධනය කිරීම.	CD	599,702.60	600,000.00	582,235.55	-	11,644.70	5,822.35	-	593,880.25		
17	නැදිමාල	2022/Q1/LGS /DEH/257/CD /01	නැදිමාල වසමේ තෝරා ගත් මාර්ග වල LED ලාම්පු සවි කිරීම -(2 වන අදියර).	CD	1,135,099.14	1,191,854.10	1,102,038.00	-	22,040.76	11,020.38	-	1,124,078.76		
18	දෙහිවල නැගෙනහිර	2022/Q1/LGS /DEH/255/SD /02	දෙහිවල නැගෙනහිර වසමේ ශ්‍රී මහා බෝධි විහාරස්ථානයේ තාප්පයේ කොටසක් කපරාරු කිරීම හා කණු දැමීම.	SD	99,987.13	100,000.00	97,074.88	-	1,941.50	970.75	97,074.88	1,941.50		
19	සරණංකර	2022/Q1/LGS /DEH/253/SD /02	සරණංකර වසමේ හින්දු ආංජනේයර් කෝවිලහි සේවක නිල නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.	SD	99,996.03	100,000.00	97,083.54	-	1,941.67	970.83	97,083.54	1,941.67		

අනු අංක ය	පළාත් පාලන කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%	ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) (ගෙවීම් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) (ගෙවීම් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
20	උද්‍යාන	2022/Q1/LGS/DEH/256/LH/01	උද්‍යාන වසමේ නිම් ඇඳුම් කර්මාන්තයේ නිරත වන තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන්ගේ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම	LH	983,794.20	983,794.20	955,140.00	-	19,102.80	9,551.40	955,140.00	19,102.80		
21	ජයතිලක	2022/Q1/LGS/DEH/261/LH/01	ජයතිලක වසමේ කාන්තා හා නිම් ඇඳුම් ක්ෂේත්‍රයේ නිරත තෝරාගත් ව්‍යවසායකයන්ගේ නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා මහන මැෂින් ලබා දීම.	LH	295,532.75	295,532.75	286,925.00	-	5,738.50	2,869.25	286,925.00	5,738.50		
22	සරණංකර	2022/Q1/LGS/DEH/253/SD/01	සරණංකර වසමේ සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ තාප්පය පිළිසකර කිරීම.	SD	99,987.92	100,000.00	97,075.64	-	1,941.51	970.76	97,075.64	1,941.51		
23	ජයතිලක	2022/Q1/LGS/DEH/256/SD/03	ජයතිලක වසමේ අබේසේල මේනියාරාම විහාරස්ථානයේ දහඅවරියන් බුදු පිළිමයේ කොටසක් ඉදිකිරීම	SD	399,989.58	400,000.00	388,339.41	-	7,766.78	3,883.39	388,339.41	7,766.78		

අනු අංක ය	පළාත් පාලන කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%	ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) (ගෙවීම් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) (ගෙවීම් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
24	ජයතිලක	2022/Q1/LGS /DEH/261/LH /03	ජයතිලක වසමේ කෙටි කැම ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීම සඳහා තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන්ට උපකරණ ලබා දීම.	LH	110,000.00	110,702.88	106,796.12	-	2,135.92	1,067.96	84,297.12	24,634.92		
25	උද්‍යාන	2022/Q1/LGS /DEH/261/SD /04	උද්‍යාන වසමේ නව පොළොන්නරු ගල්විහාරයේ පිටුපස තාප්පය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	SD	399,944.38	400,000.00	388,295.52	-	7,765.90	3,882.95	-	396,061.42		
26	නැදිමාල	2022/Q1/LGS /DEH/257/SD /02	නැදිමාල වසමේ නැදිමාල ශ්‍රී බෝමානන්ද දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.	SD	399,999.98	400,000.00	388,349.51	-	7,766.98	3,883.49	388,349.51	7,766.98		
27	දෙහිවල නැගෙනහිර	2022/Q1/LGS /DEH/255/SD /01	දෙහිවල නැගෙනහිර වසමේ වෛද්‍ය පාරේ විද්‍යා වර්ධන පිරිවෙනේ ධර්ම ශාලාවේ තීන්ත ආලේප කිරීම.	SD	99,989.26	100,000.00	97,076.95	-	1,941.54	970.77	-	99,018.49		
එකතුව					12,056,511.05	12,437,439.05	11,705,350.62	-	234,106.95	117,053.48	5,757,979.63	6,181,477.94		

පවරන පරිපාලන වියදම = -83652.13

අනු අංක ය	පළාත් පාලන කොට්ඨාසය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්ෂේත්‍රය	වෙන් කළ මුදල (රු.)	මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.)	වැඩ වටිනාකම (රු.) (1)	VAT වටිනාකම (රු.) (2) = (1)*8%	2% ප්‍රා.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (3)	1% දි.ලේ.පරිපාලන වියදම (රු.) (4)=(1)*1%	ප්‍රා.ලේ. මුළු සත්‍ය වියදම (රු.) (5) (ගෙවීම් කළ)	ප්‍රා.ලේ. අතැති බිල්පත් වටිනාකම (රු.) (6) (ගෙවීම් නොකළ)	ව්‍යාපෘතිය වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර තත්වය	ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු තත්වය
-----------	---------------------	----------------	----------------	-----------	--------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	---

සත්‍ය අතැති බිල්පත් වටිනාකම = 6,097,825.81
